


R1F 柱牆、R2FL 樑版

完成時間 113 年 01 月 23

柱筋續接施做



柱筋續接扭力測試查驗

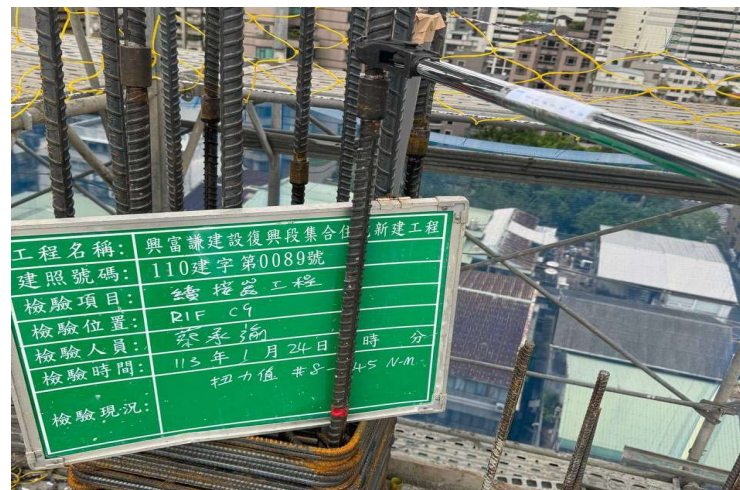

柱筋綁紮



柱筋查驗



R1F 柱牆、R2FL 樑版

完成時間 113 年 01 月 25

柱內配管




R1F 單面模組立



R1F 柱模組立



R1F 牆筋綁紮

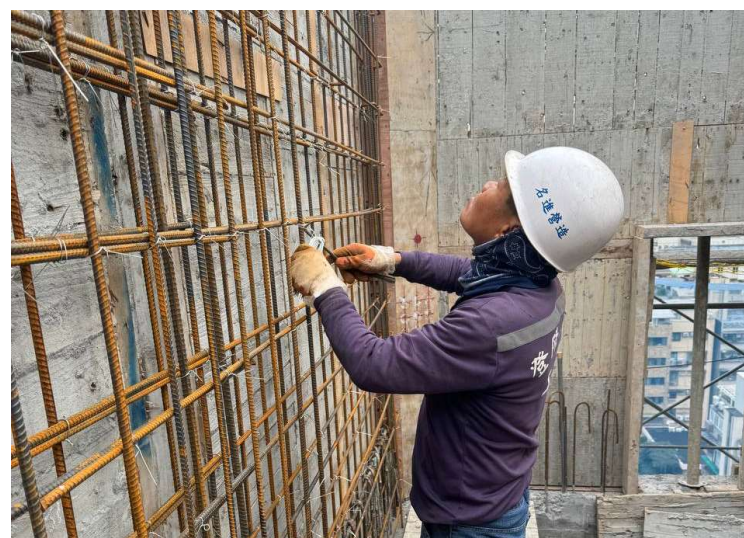

R1F 柱牆、R2FL 樑版

完成時間 113 年 01 月 28

R1F 牆筋查驗




R1F 柱牆封模



R2F 版筋綁紮




R1F 樓梯組模

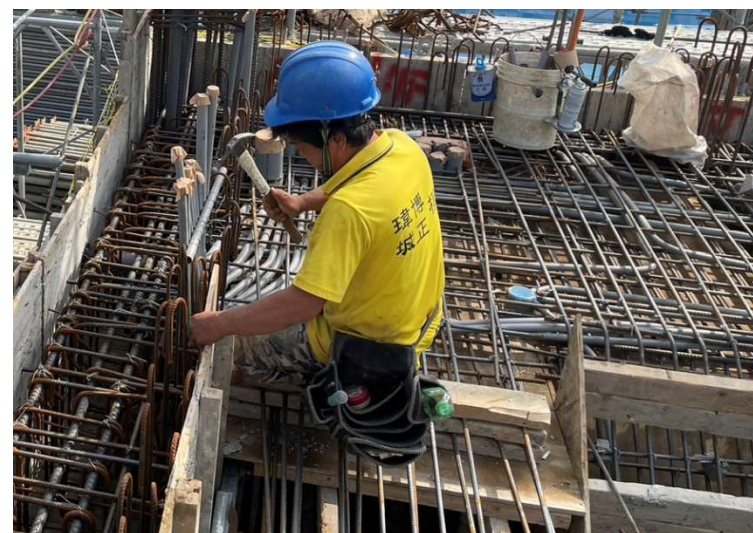

R1F 柱牆、R2FL 樑版

完成時間 113 年 02 月 20

R1F 模板加固

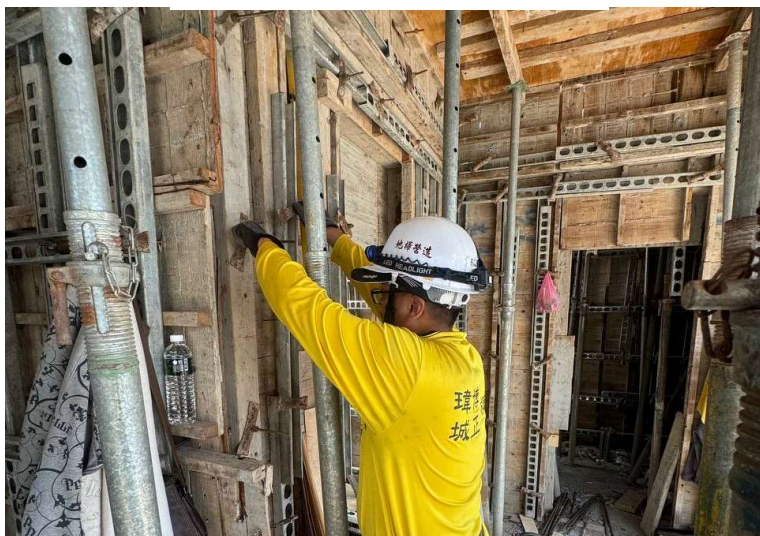


R2F 灌漿



R2F 版灌漿



R2F 版灌漿完成

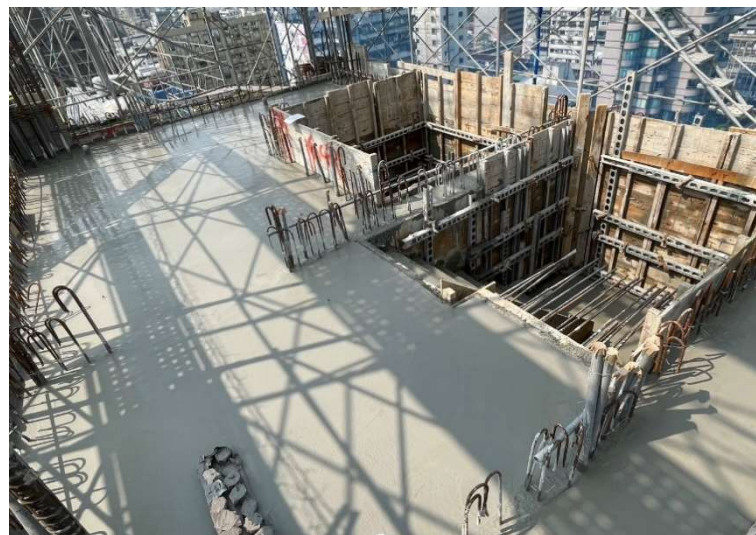

2F-8F 輕隔間材料進場



2F-8F 輕隔間材料進場



3F-8F 外牆泥作吊線



室內拉線施作



B1F 導水版施作



B1F 導水版作



輕隔間骨架組立



輕隔間槽鐵打鑿施作



輕隔間骨架組立



輕隔間配管

