

外觀



鷹架吊料



鋼筋吊料



3F柱筋續接扭力測試查驗



四樓版完成

完成時間112年08月05日

柱筋綁紮



柱筋間距查驗(1)



柱筋間距查驗(2)



柱筋間距查驗(3)



柱筋彎鉤查驗



機電配管電盒安裝



柱牆單面模板組立



公共排水溝例行性清洗



牆筋綁紮



牆筋開口補強



鋼筋彎曲試驗 (1)



鋼筋彎曲試驗 (2)



鋼筋拉伸試驗 (1)



鋼筋拉伸試驗 (2)



鋼筋拉伸彎曲試驗



2FL水泥柱體壓力測試 350kgf_實驗室




2FL水泥柱體壓力測試 350kgf_試驗中



2FL水泥柱體壓力測試 350kgf



模板樑寬尺寸查驗

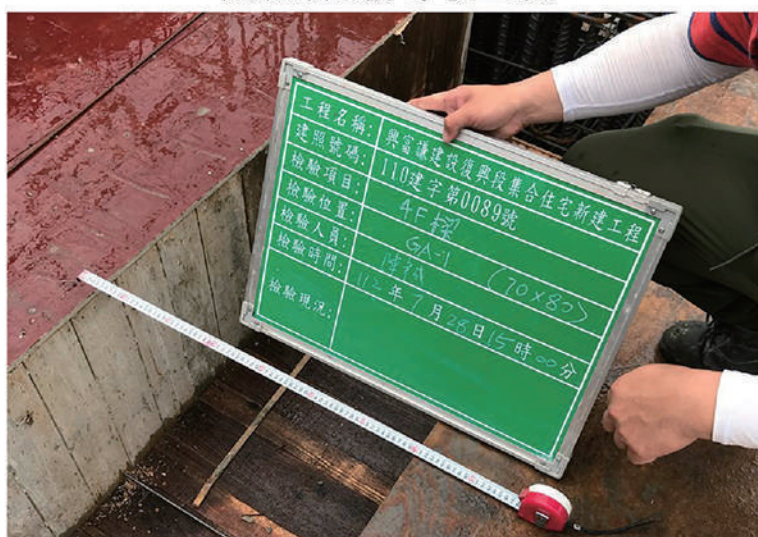

模板樑深尺寸查驗



4F樑版筋吊料



樑筋綁紮

樑筋查驗



4F版筋綁紮



機電管線配置



鷹架工程三角架預埋螺絲



標高器施作



止水鋼板施作




建築師查驗



機電查驗及灌漿前拍照記錄



柱頭鋪設帆布保護，避免灌漿汙染

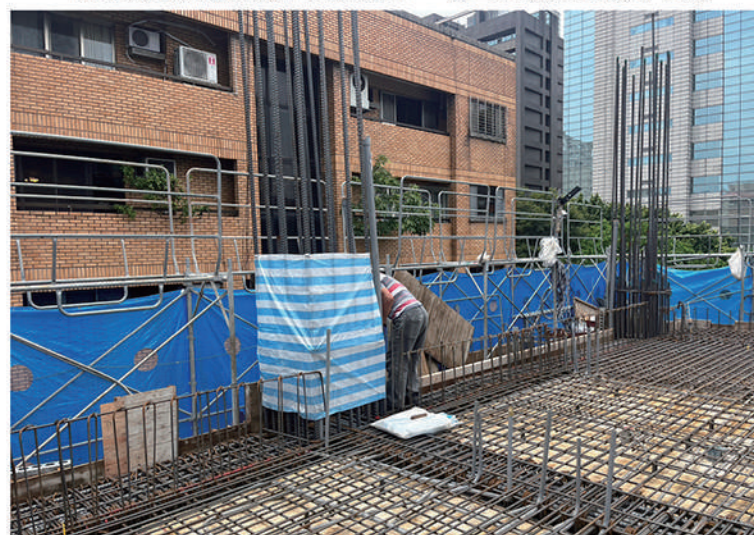

四樓版完成

完成時間112年08月05日

灌漿前版面清洗及濕潤模板



4FL混凝土澆置



灌漿後鋪設麻布袋灑水養護



4FL灌漿後高程收方

